Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO MEJORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CLIMATIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CALOR HOSPITAL DE COSLADA.**	**365 días**	**lun 08/05/23**	**jue 10/10/24**	
2		DEMONTAJE DE 2 ENFRIADORAS, 2 TORRES DE REFRIGERACIÓN Y BOMBAS HIDRÁULICAS EXISTENTES EN CUBIERTA. INSTALACIÓN DE 2 ENFRIADORAS, 2 BOMBAS DE CALOR Y BOMBAS HIDRÁULICAS.	37 días	lun 08/05/23	jue 29/06/23	
3		REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA.	27 días	vie 30/06/23	mar 08/08/23	2
4		DESMONTAJE DE SALA DE CALDERAS EXISTENTE E INSTALACIÓN DE 3 NUEVAS CALDERAS DE GAS NATURAL Y DEMÁS ELEMENTOS.	44 días	mié 09/08/23	mar 10/10/23	3
5		INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA HACIA LA ZONA DE HOSPITALIZACIÓN.	12 días	mié 11/10/23	vie 27/10/23	4
6		**PLANTA BAJA.**	**56 días**	**lun 30/10/23**	**vie 19/01/24**	
7		**ZONA NORTE.**	**28 días**	**lun 30/10/23**	**lun 11/12/23**	
8		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	5
9		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	26 días	mar 31/10/23	jue 07/12/23	8
10		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23	9
11		**ZONA SUR.**	**28 días**	**mar 12/12/23**	**vie 19/01/24**	
12		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	mar 12/12/23	mar 12/12/23	10
13		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	26 días	mié 13/12/23	jue 18/01/24	12
14		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	vie 19/01/24	vie 19/01/24	13
15		**PLANTA PRIMERA.**	**56 días**	**lun 22/01/24**	**lun 08/04/24**	
16		**ZONA NORTE.**	**28 días**	**lun 22/01/24**	**mié 28/02/24**	
17		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24	14
18		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	26 días	mar 23/01/24	mar 27/02/24	17

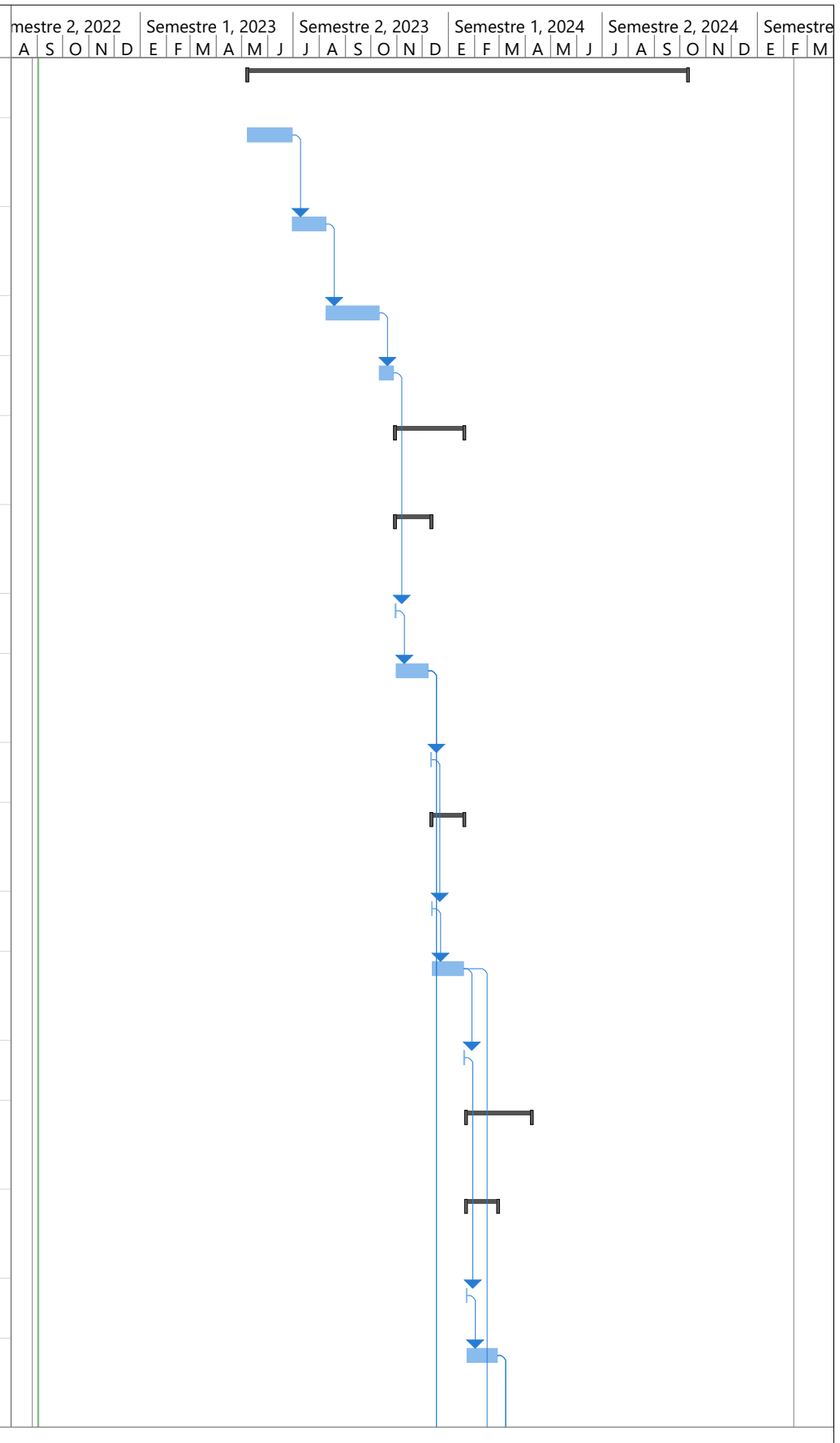

Proyecto: 220902 VAR V02 PLA
Fecha: vie 02/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
19		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	mié 28/02/24	mié 28/02/24	18
20		**ZONA SUR.**	**28 días**	**jue 29/02/24**	**lun 08/04/24**	
21		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	jue 29/02/24	jue 29/02/24	19
22		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	26 días	vie 01/03/24	vie 05/04/24	21
23		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24	22
24		**PLANTA SEGUNDA.**	**56 días**	**mar 09/04/24**	**mar 25/06/24**	
25		**ZONA NORTE.**	**28 días**	**mar 09/04/24**	**jue 16/05/24**	
26		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	mar 09/04/24	mar 09/04/24	23
27		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	26 días	mié 10/04/24	mié 15/05/24	26
28		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	jue 16/05/24	jue 16/05/24	27
29		**ZONA SUR.**	**28 días**	**vie 17/05/24**	**mar 25/06/24**	
30		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	vie 17/05/24	vie 17/05/24	28
31		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	26 días	lun 20/05/24	lun 24/06/24	30
32		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	mar 25/06/24	mar 25/06/24	31
33		**PLANTA TERCERA.**	**77 días**	**mié 26/06/24**	**jue 10/10/24**	
34		**ZONA NORTE.**	**28 días**	**mié 26/06/24**	**vie 02/08/24**	
35		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	mié 26/06/24	mié 26/06/24	32
36		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	26 días	jue 27/06/24	jue 01/08/24	35

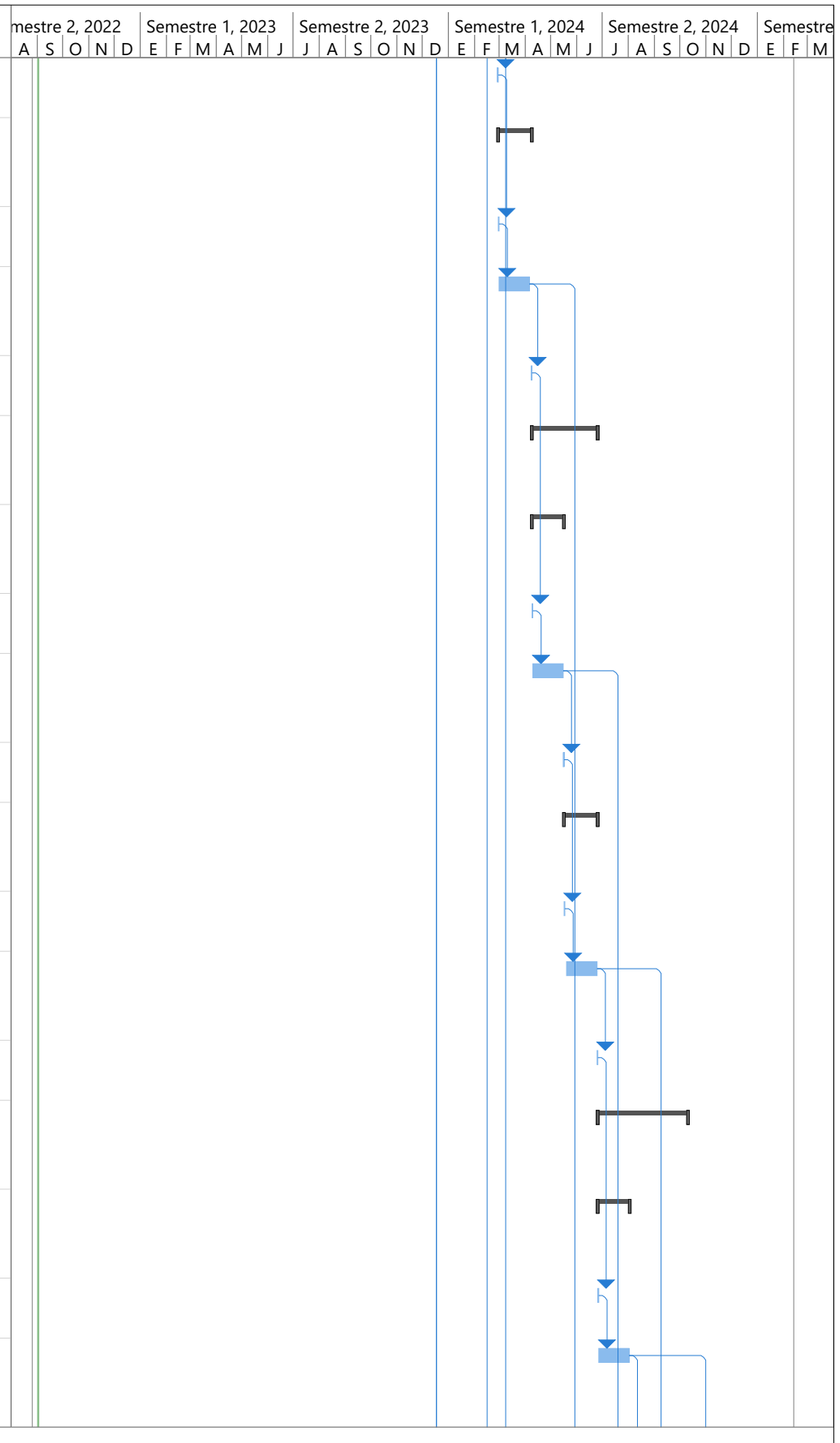

Proyecto: 220902 VAR V02 PLA
Fecha: vie 02/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
37		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	vie 02/08/24	vie 02/08/24	36
38		**ZONA SUR.**	**28 días**	**lun 05/08/24**	**mié 11/09/24**	
39		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	lun 05/08/24	lun 05/08/24	37
40		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	26 días	mar 06/08/24	mar 10/09/24	39
41		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	mié 11/09/24	mié 11/09/24	40
42		**ZONA GERENCIA.**	**21 días**	**jue 12/09/24**	**jue 10/10/24**	
43		DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24	41
44		DESMONTAJE DE TECHOS, CLIMATIZADORAS, TUBERÍAS, CONDUCTOS, ETC. MONTAJE DE FANCOILS, TUBERÍAS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN, CONTROL, TECHOS, ETC.	19 días	vie 13/09/24	mié 09/10/24	43
45		MONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS. DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROVISIONAL.	1 día	jue 10/10/24	jue 10/10/24	44
46		**PROYECTO PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA E ILUMINACIÓN LED EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL ASEPEYO DE COSLADA.**	**307 días**	**lun 11/12/23**	**mié 12/02/25**	
47		**ILUMINACIÓN INTERIOR, CABLEADO Y CUADROS ELÉCTRICOS.**	**307 días**	**lun 11/12/23**	**mié 12/02/25**	
48		PLANTA SÓTANO.	17 días	vie 29/12/23	lun 22/01/24	53
49		**PLANTA ENTREPLANTA.**	**26 días**	**lun 18/03/24**	**lun 22/04/24**	
50		ZONA NORTE.	13 días	lun 18/03/24	mié 03/04/24	56
51		ZONA SUR.	13 días	jue 04/04/24	lun 22/04/24	50
52		**PLANTA BAJA.**	**63 días**	**lun 11/12/23**	**jue 07/03/24**	
53		ZONA NORTE.	13 días	lun 11/12/23	jue 28/12/23	9

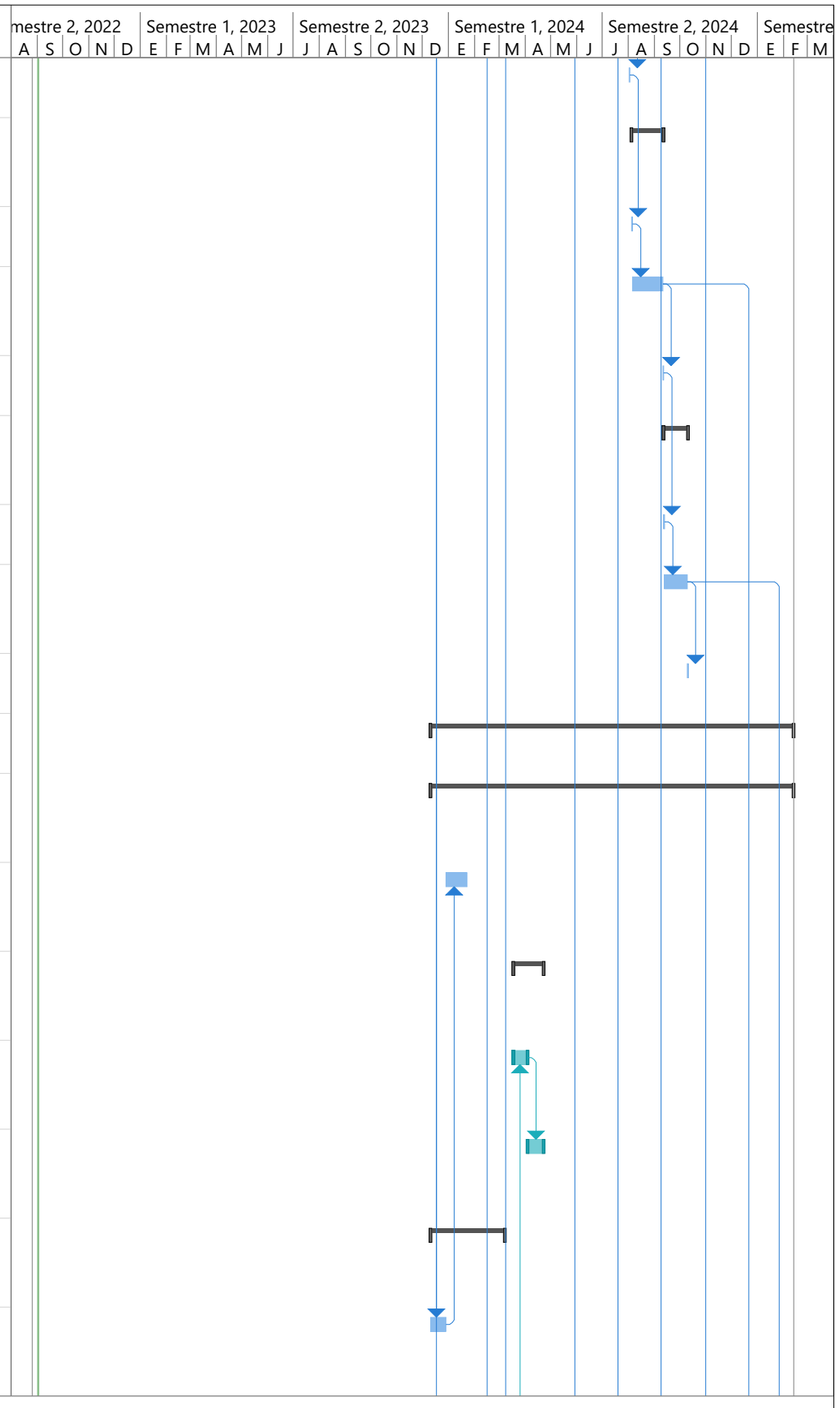

Proyecto: 220902 VAR V02 PLA
Fecha: vie 02/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
54		ZONA SUR.	13 días	mar 20/02/24	jue 07/03/24	13
55		**PLANTA PRIMERA.**	**81 días**	**mié 28/02/24**	**mié 19/06/24**	
56		ZONA NORTE.	13 días	mié 28/02/24	vie 15/03/24	18
57		ZONA SUR.	13 días	lun 03/06/24	mié 19/06/24	22
58		**PLANTA SEGUNDA.**	**50 días**	**mié 24/07/24**	**mar 01/10/24**	
59		ZONA NORTE.	13 días	mié 24/07/24	vie 09/08/24	27
60		ZONA SUR.	13 días	vie 13/09/24	mar 01/10/24	31
61		**PLANTA TERCERA.**	**72 días**	**mar 05/11/24**	**mié 12/02/25**	
62		ZONA NORTE.	13 días	mar 05/11/24	jue 21/11/24	36
63		ZONA SUR.	13 días	jue 26/12/24	lun 13/01/25	40
64		ZONA GERENCIA.	9 días	vie 31/01/25	mié 12/02/25	44
65		**ILUMINACIÓN EXTERIOR, CABLEADO Y CUADROS ELÉCTRICOS.**	**8 días**	**lun 06/05/24**	**mié 15/05/24**	
66		APARCAMIENTO 1.	3 días	lun 06/05/24	mié 08/05/24	75
67		APARCAMIENTO 2.	5 días	jue 09/05/24	mié 15/05/24	66
68		**INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.**	**104 días**	**lun 11/12/23**	**vie 03/05/24**	
69		**CUBIERTA PLANTA TERCERA.**	**66 días**	**lun 11/12/23**	**mar 12/03/24**	

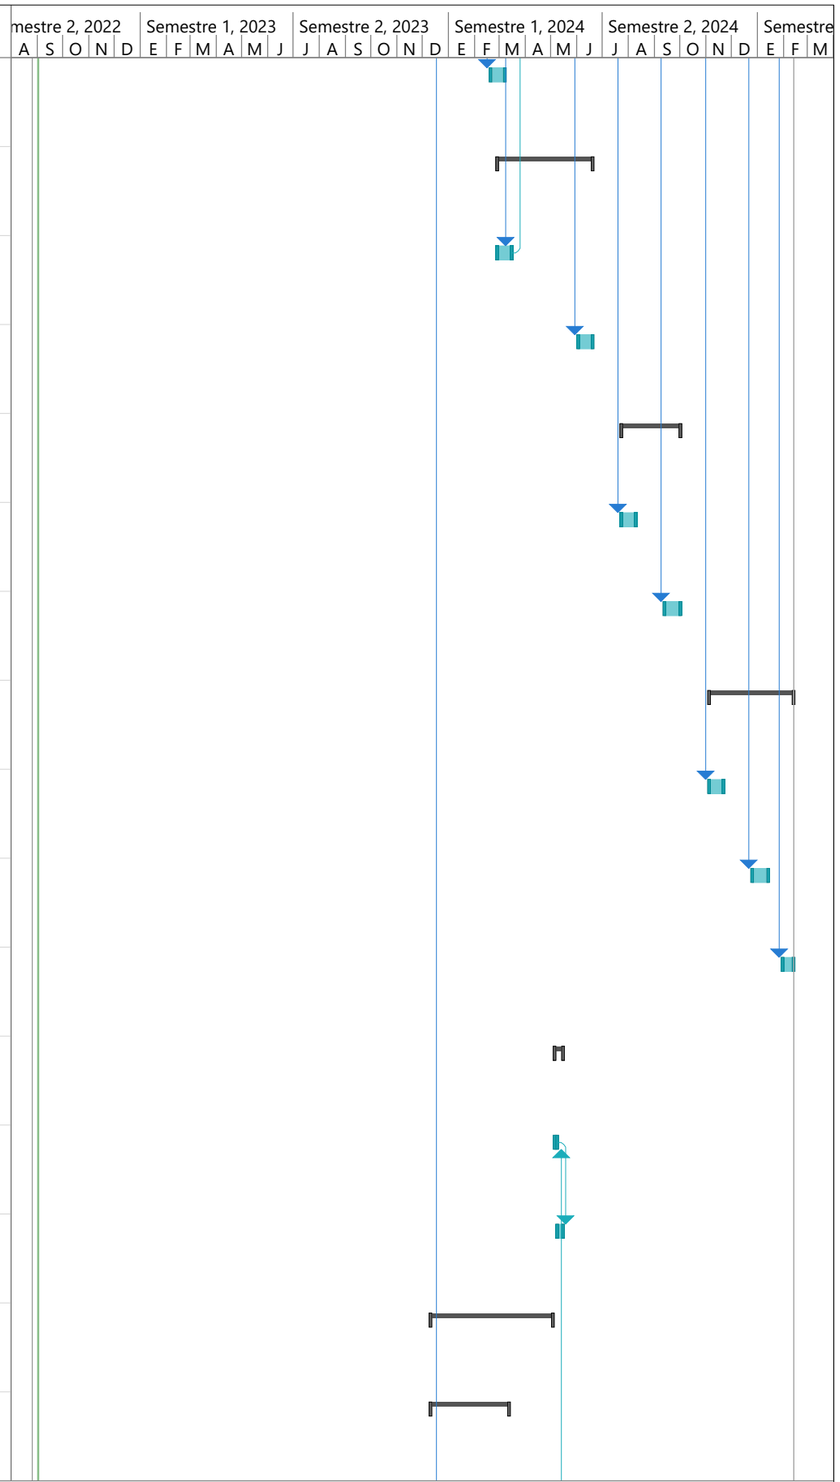

Proyecto: 220902 VAR V02 PLA
Fecha: vie 02/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
70		INSTALACIÓN INVERSOR 60kW.	39 días	lun 11/12/23	vie 02/02/24	9
71		INSTALACIÓN INVERSOR 30kW.	19 días	lun 05/02/24	jue 29/02/24	70
72		INSTALACIÓN INVERSOR 12kW.	8 días	vie 01/03/24	mar 12/03/24	71
73		**CUBIERTA PLANTA BAJA.**	**38 días**	**mié 13/03/24**	**vie 03/05/24**	
74		INSTALACIÓN INVERSOR 30kW.	19 días	mié 13/03/24	lun 08/04/24	72
75		INSTALACIÓN INVERSOR 30kW.	19 días	mar 09/04/24	vie 03/05/24	74

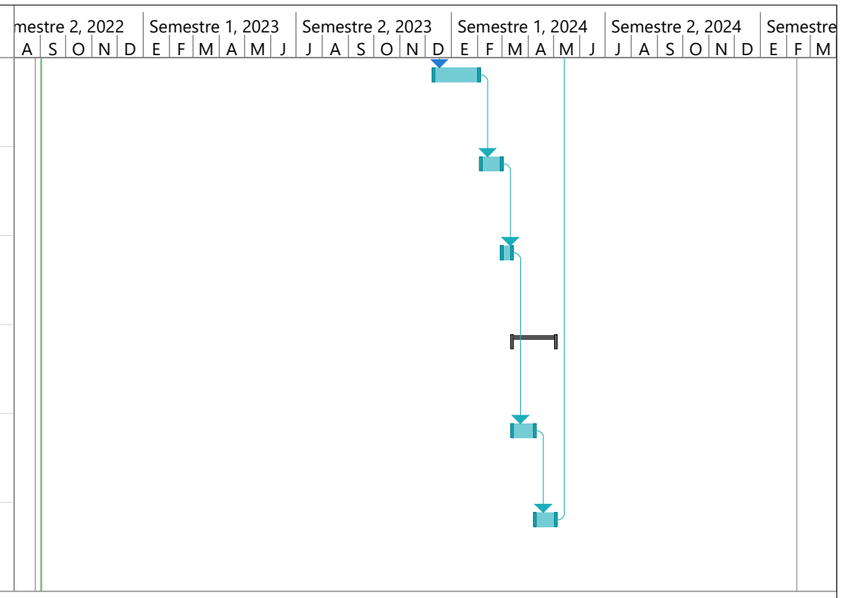

Proyecto: 220902 VAR V02 PLA
Fecha: vie 02/09/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
